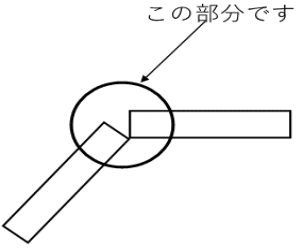


公 表

第60回技能五輪全国大会 出場者からの質問と回答

		質問	回答
1	石積み	石積み用石材を調達先から購入したが、寸法が110×130×600あった。競技当日に同じような石材が支給されると、段逃げの高さに誤差が生じてしまうが、そのようなことは想定しなくても良いか。	砂を追加支給する。横目地を砂目地とし、変更した図面の範囲内の高さで石積みを施工する。 (※変更した図面を参照のこと。)
2	石積み	資材調達先で購入した石材のノミ切り部分が支給材料表に記載されている寸法より5～7mm大きいため、目地なし施工では段落ち部分の高さが図面の寸法レベルを超えてしまうので、詳細図での対応をお願いしたいです。	
3	石積み	石積みは、縦・横目地ともに無しという認識で良いですか。	横目地は砂目地で施工する。 縦目地は各自の裁量に任せる。
4	石積み	切石積みは目地を入れますか。目地を入れる場合は砂でしょうか。また、縦目地・横目地について指定はありますか。	
5	石積み	L型部分のノミ切り（100×120面）ではなく、100×600面を2面（天端と下端）を切削した石材支給は可能ですか。	支給しない。
6	石積み	中央内角の接点部分の施工についてですが、天端石は平面図のように施工するというのがありますが、根石から3段目までの詳細図が記載されていないので、角を合わせる下図のような施工でよろしいですか。  根石から3段目までの角の施工	良い。
7	石積み	中央内角を算木に積んでいけば支給材料では足りなくなりますが、支給材料の追加はご検討いただけますか。	石積み用石材の追加支給はしない。
8	石積み	石積みの高さが変わる位置について、図面上寸法がありませんが、図面のように施工すればいいですか。	図面のように施工する。
9	石積み	切石積みは断面図を見ると、120mmの面を正面に積んでいますが、すべて120mmの面を正面にすることで良いのでしょうか。	
10	小舗石	小舗石の目地高は±0か。	各自の裁量に任せる。
11	小舗石	小舗石及びゴロタ石は、割るなどの加工をしても良いか。	小舗石は加工可。 ゴロタ石は加工不可。
12	小舗石	実際に施工してみましたが、支給材料表通りの個数（90個）では足りなく、過去大会の同じような課題図面の支給数（120個）のように、少し増やしていただくことは可能ですか。	追加で10個小舗石を支給する。（合計100個）

13	小舗石	砂の支給がないため、小舗石と水鉢下のゴロタ石の目地は、区画内の客土を使用するという ことよろしいでしょうか。	目地は客土を使用する。
14	ゴロタ石	ゴロタ石敷き使用するゴロタ石は、アタリも 含め加工不可という認識で良いですか。	良い。
15	敷石	敷石の位置の寸法が表示されておりませんが、 図面上で確認するのですか。	図面の通り施工する。
16	垣根	竹垣（自由課題）の作製には、支給された長さ 以外のビス及び釘を使用してもよいか。	良い。
17	垣根	竹垣（自由課題）の作製材料として、支給され たベニア板を加工して使用してもよいか。	ベニア板は支給材料ではないため、自由課題の垣 根に使用することは不可。
18	垣根	竹の元末の順番について。	各自の裁量に任せる。
19	垣根	上に乗せる板の固定方法は決まっていますか。	垣根の天端板（傘木）は釘止めとする。
20	垣根	自由課題の垣根について、区画の正面以外（区 画短辺方向の外側など）から鑑賞されることは 考慮すべきですか。	各自の裁量に任せる。
21	垣根	垣根の胴縁と立子の結束方法に関して、シュロ縄の 結び方に指定はありますか。	結束は、シュロ縄を2本使いで裏綾掛けいぼ結びと する。
22	植栽	支給されるサツキツツジは全て使用しなければ ならないですか。	各自の裁量に任せる。
23	草花植栽	草花植栽について、指定の区画を全て埋める必 要はないとの認識で良いですか。	
24	芝の植え付け	芝の植え付けの完成高さは芝の葉先がGL±0 という認識で良いですか。	良い。
25	支給材料	芝生の種類は張芝かロール芝どちらでしょう か。サイズも教えていただきたいです。	切芝を予定。サイズについては競技前日（11月4 日）、会場で確認。
26	支給材料	石積み用石材について、8月29日現在、市場 に流通していないようですが、大会当日に支給 していただく分の数量は確保・準備等されてい るのでしょうか。	準備している。
27	支給材料	小舗石、敷石、ごろた石また台石は白色御影石 でしょうか。	小舗石、敷石は白色御影石。 台石は競技前日（11月4日）、会場で確認。 ゴロタ石は伊勢ゴロタを支給する予定。 伊勢ゴロタ 5～6寸 2袋 3～4寸 1袋 2寸 1袋。
28	支給材料	ゴロタ石はどのような種類の石ですか。	
29	支給材料	台石の形状は自然石でしょうか。それとも天端 が加工されている石でしょうか。	飛石用石材を予定。
30	支給材料	中木は全て単幹でしょうか。	単幹を予定。
31	支給材料	芝は切芝ですか。	切芝を予定。
32	その他	盛土は最初から入っていますか。	会場設備基準の通り。
33	その他	支給されるベニア板を石積み裏の盛土の土留め として使用し、その状態で完了としても良いで すか。	ベニア板を土留めとして使用するの不可。

34	その他	客土を区画外に養生して仮置きしても良いでしょうか。また、1日目終了時に仮置きした状態で終了しても良いでしょうか。	良い。ただし、指定をした位置に仮置きすること。
35	その他	床掘等作業のため、モジュール採点時に区画内のGLが規定の高さでなくても良いですか。	良い。
36	その他	遣り方を組む際に使用するビスや釘を持ち込んでも良いでしょうか。	遣り方に使用するビスや釘を持参しても良い。ただし、作業終了後に跡など目立たないように仕上げる事。
37	その他	区画の構成に関して、角部の内側と外側のどちらにL字金具が使用されていますか。	外側で固定。
38	その他	当日水を汲める設備はありますか。	給水場所が設置してある。
39	その他	水鉢には水を張るのでしょうか。	水を張る。
40	その他	大会前日の下見はおおよそ何分と考えていますか。	約30分を予定。
41	その他	水平垂直な作業区画の設置をよろしく願います。	設営業者へ再度確認します。
